



Projeto Acadêmico ERP

VidaPlus

Implantação integrada de ERP: da redução de retrabalho à decisão orientada por dados.

Equipe de Implantação:

Pedro Nunes (Negócios)

Maycon Ferreira (ERP) • Amanda Omura (UX / Protótipos)

Juliana Alves (Gestão) • David Rangel (Dados / KPIs)

O Cenário Atual: Desconexão e Retrabalho



A gestão isolada atual gera 4 gargalos críticos na operação da empresa:



Estoque

Falta de visão global gera ruptura e aciona compras emergenciais caras.



Operadoras

Guias sem integração e padronização causam rejeições de pagamento.



Financeiro

Conferência manual e duplicidade geram atrasos no caixa.



Gestão

Diretoria trabalha com dados tardios e sem visibilidade de gargalos.

A Lógica Central da Solução

O projeto ERP não trata tecnologia isolada: cada módulo responde a uma dor de negócio medida por KPIs.



Business Canvas e Integração do Fluxo

Business Model Canvas

Clientes

Pacientes, Convênios e Empresas parceiras.

Proposta de Valor

Atendimento ágil, dados seguros e faturamento correto.

Canais

Unidades, Call Center, Web e Portal de Operadoras.

Atividades-chave

Atendimento, controle de estoque, faturamento e fluxo de caixa.

Recursos-chave

Corpo clínico, sistemas de gestão (ERP), dados e infraestrutura.

Estrutura Financeira (Custos e Receitas)

Receitas: Consultas, exames particulares e repasses de convênios.
Custos: Materiais, licenças, folha de pagamento e tributos.

Fluxo Integrado pelo ERP

1. Recepção



2. Atendimento



3. Convênio



4. Financeiro



5. Compras



6. Estoque



7. Relatórios e Gestão (KPIs)

Módulos SAP e Integrações Escolhidas

Adoção nativa de processos líderes de mercado com baixa customização.

MM

Compras e Materiais

Resolve a ruptura de estoque, unifica o almoxarifado e controla consumos e reposições.

SD

Faturamento

Organiza o atendimento na ponta, cobranças, regras de negócio e faturamento ágil.

FI

Financeiro

Contas a pagar/receber unificadas, fim do retrabalho e aceleração de fechamentos.

TISS

Integração Operadoras

Troca de padrão nacional XML para autorizações e guias diretamente acopladas ao ERP.

ACESSOS

Usuários e Segurança

Controle restrito de perfis, auditorias (logs) e garantia de governança (LGPD).

SAP escolhido por integração, baixa customização e aderência aos processos corporativos.

O Que Entra e o Que Fica de Fora

Definição clara das fronteiras do projeto para proteger o prazo de 6 meses.

Dentro do Escopo

- ✓ Cadastro único de pacientes, unidades e usuários
- ✓ Fluxo de compras, controle de estoque e consumo
- ✓ Faturamento, financeiro (pagar/receber) e conciliações
- ✓ Integração padronizada com operadoras (TISS)
- ✓ Painéis gerenciais e indicadores de desempenho (KPIs)

VS

Fora do Escopo

- ✗ Desenvolver um software do zero (foco no ERP)
- ✗ Customização SAP complexa fora das boas práticas
- ✗ Integração com a totalidade dos sistemas legados
- ✗ Implantação de Prontuário Eletrônico completo
- ✗ Processos e áreas operacionais não mapeadas na Fase 1

UX: Telas Pensadas para o Fluxo Real

Ação principal em evidência e status visual para garantir adoção > 90%.

Busca de Paciente | ID: 9021

Status: **AUTORIZADO**

Gerar Guia

Recepção
Cadastro e Atendimento

TISS | Lote de Envio

Guia: 12903 | Bradesco | Pendente

Guia: 12904 | Amil | **Alerta Glosa**

Transmitir Lote

Operadoras (TISS)
Faturamento s/ Glosa

Dash | Saldo de Materiais

Seringas
12 CX
Abaixo do Mín.

Gaze
45 CX
Ok

Solicitar Compra

Compras e Estoque
Visibilidade e Reposição

Fluxo de Caixa Diário

Pagar hoje: R\$ 12.500
Receber hoje: R\$ 34.000
Saldo final previsto: **R\$ +21.500**

Conciliar Automático

Financeiro Gerencial
Pagar/Receber e Fechamento

A Regra de Ouro

O ERP não pode ser um obstáculo. A tela de cada colaborador foi prototipada seguindo diretrizes rígidas:

- 1. Menos campos** (só o essencial)
- 2. Ação principal evidente** (botões claros)
- 3. Feedback de sucesso** ou erro imediato

O resultado é uma meta ambiciosa, mas realista:
adoção do sistema superior a **90%** no primeiro mês.

Gestão: EAP, Cronograma e Implantação (6 Meses)



EAP Resumida

1. Iniciação:

Termo de abertura, stakeholders.

2. Planejamento:

Escopo, matriz de riscos, plano de comunicação.

3. Execução:

SAP FI, MM, SD, Integração TISS e Acessos.

4. Monitoramento:

Acompanhamento de cronograma, custos e KPIs.

5. Encerramento:

Go-live, suporte assistido, lições aprendidas.

Plano de Comunicação e Treinamento

Governança:

Reuniões semanais e Dashboard do projeto para stakeholders.

Key Users (Mês 4):

Treinamento profundo de 8 multiplicadores (recepção, compras, financeiro).


Usuários Finais (Mês 5):

Treinamentos práticos e focados por perfil de acesso.

Suporte Assistido (Mês 6):

Acompanhamento integral no Go-Live para garantir a meta de >90% de adoção.

Matriz de Riscos e Planos de Mitigação

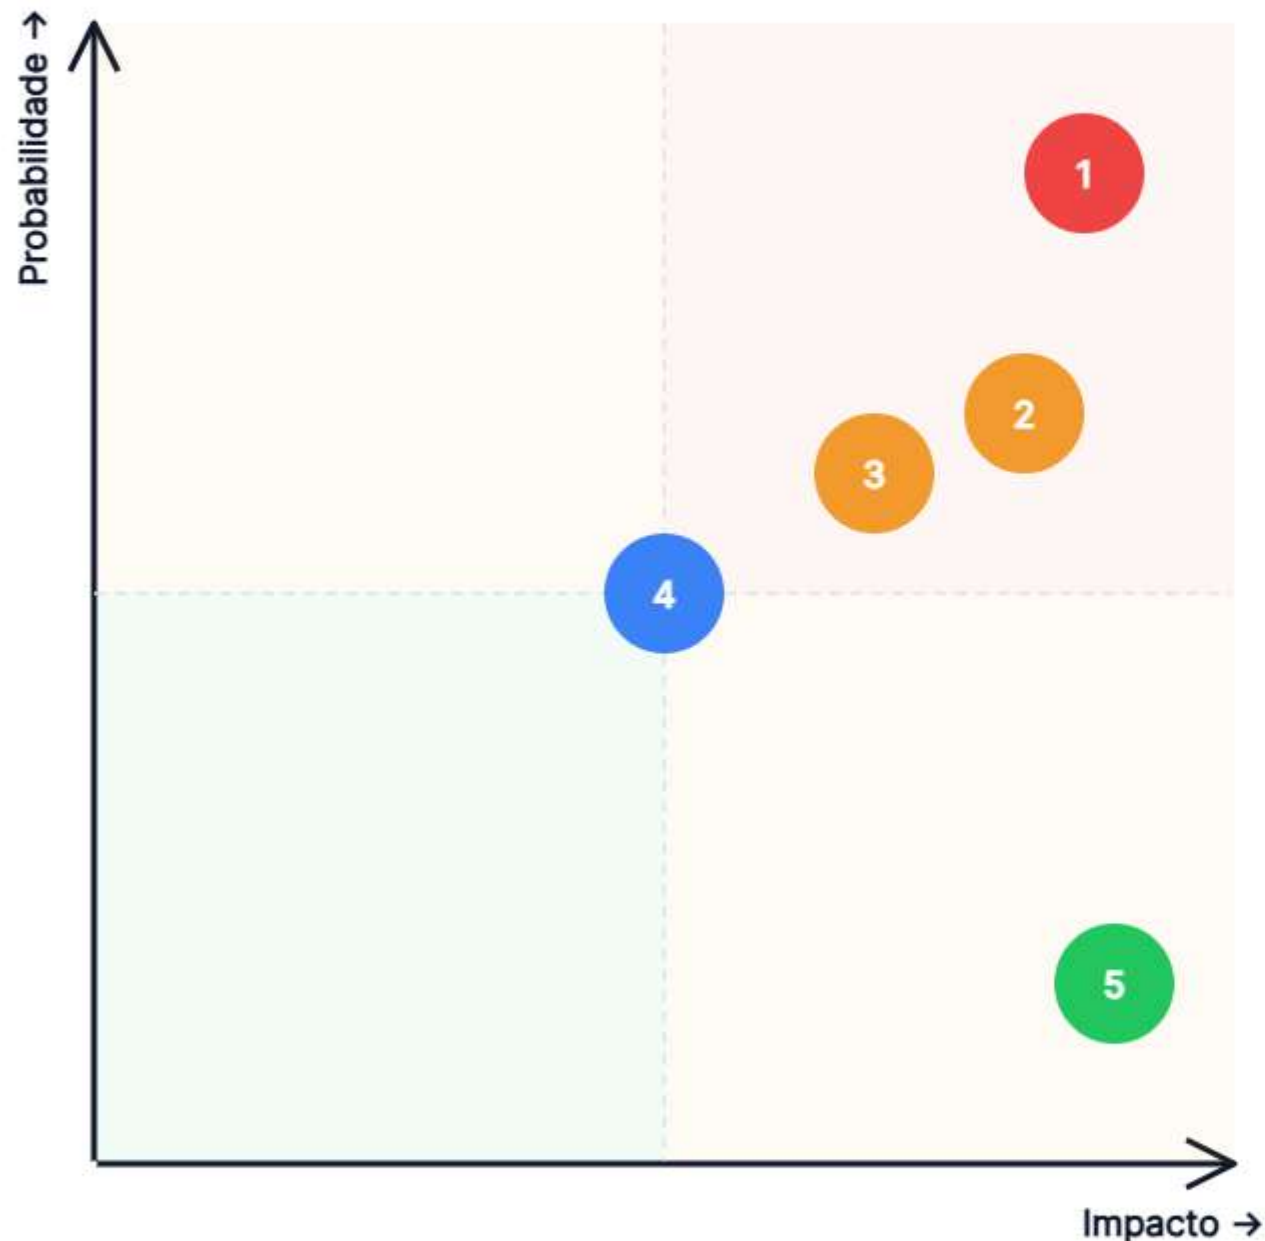

1. Resistência dos usuários (Alta/Alto)

Mitigação: Treinamento intensivo por perfil e uso massivo de key users operacionais.

2. Integração TISS/Operadoras (Média/Alto)

Mitigação: Testes rigorosos em ambiente de qualidade (QAS) usando casos reais.

3. Dados Inconsistentes (Média/Alto)

Mitigação: Limpeza pesada na base legada e dupla validação antes da migração final.

4. Aprovação da Gestão (Média/Médio)

Mitigação: Comitê executivo e decisões rápidas registradas em ata formal.

5. Risco LGPD e Segurança (Baixa/Alto)

Mitigação: Estrutura rígida de perfis de acesso (módulo ACESSOS) e trilha de logs.

Viabilidade Financeira e ROI

Projeto se paga em 18 meses com a eliminação de retrabalho e redução de perdas operacionais.

CAPEX INICIAL

R\$ 450 mil

BENEFÍCIO LÍQUIDO ANUAL

R\$ 300 mil

OPEX ANUAL


R\$ 180 mil

PAYBACK

18 meses

Licenças e Consultoria representam 73% do investimento inicial

Valores absolutos; Total = 450

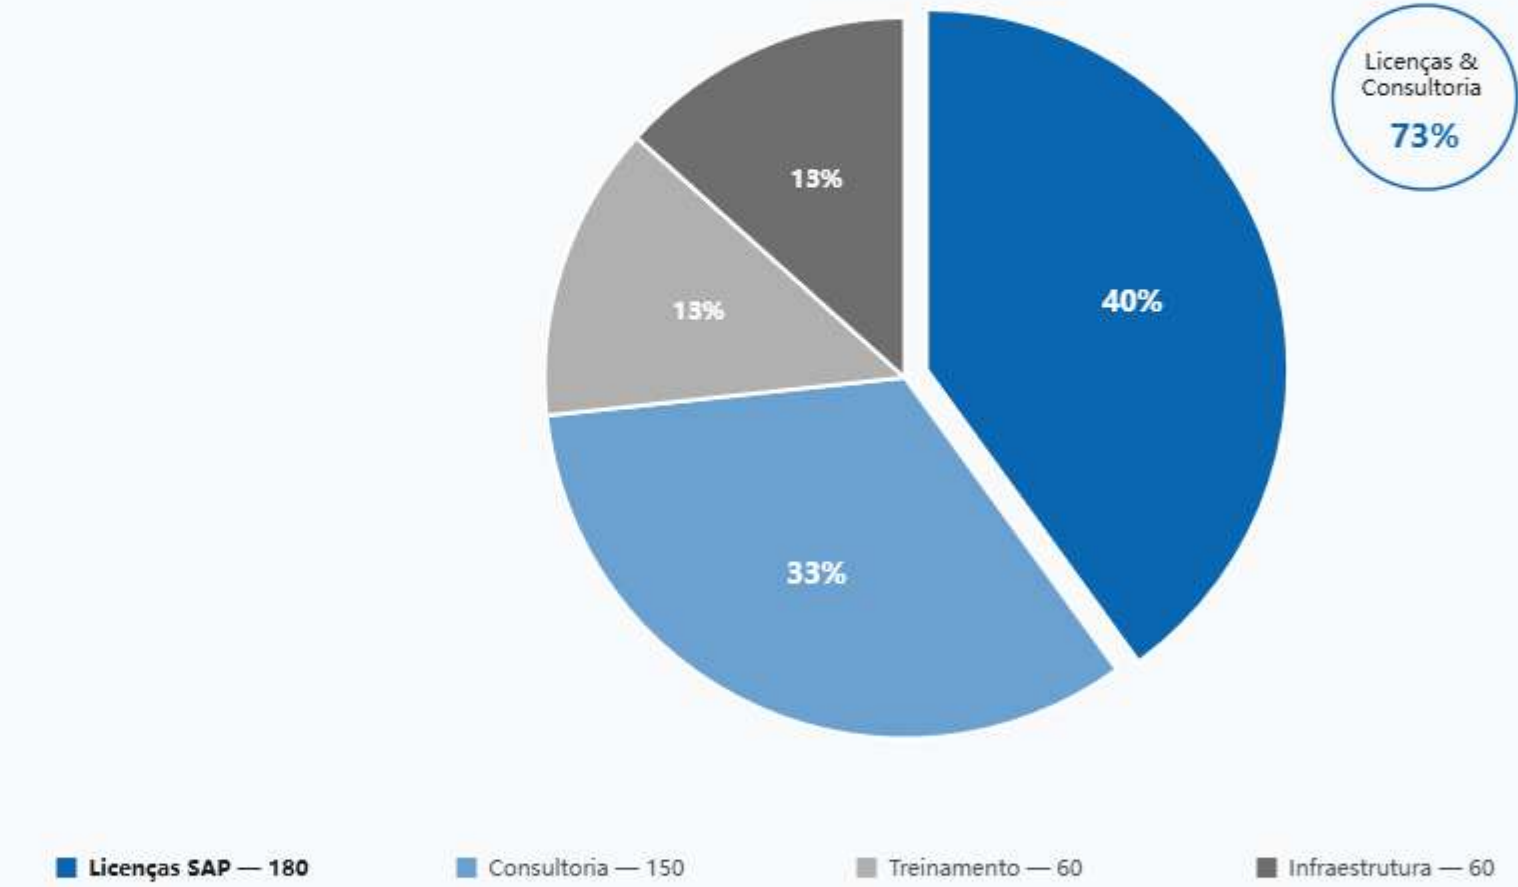

KPIs e Benefícios Esperados

Fechamento Financeiro

~~15~~ → **4 dias**

Lead Time de Compras


~~12~~ → **7 dias**

Adoção pelo Usuário Final

> 90% no primeiro mês

Redução expressiva nas principais dores operacionais (%)

■ Antes do ERP ■ Após o ERP

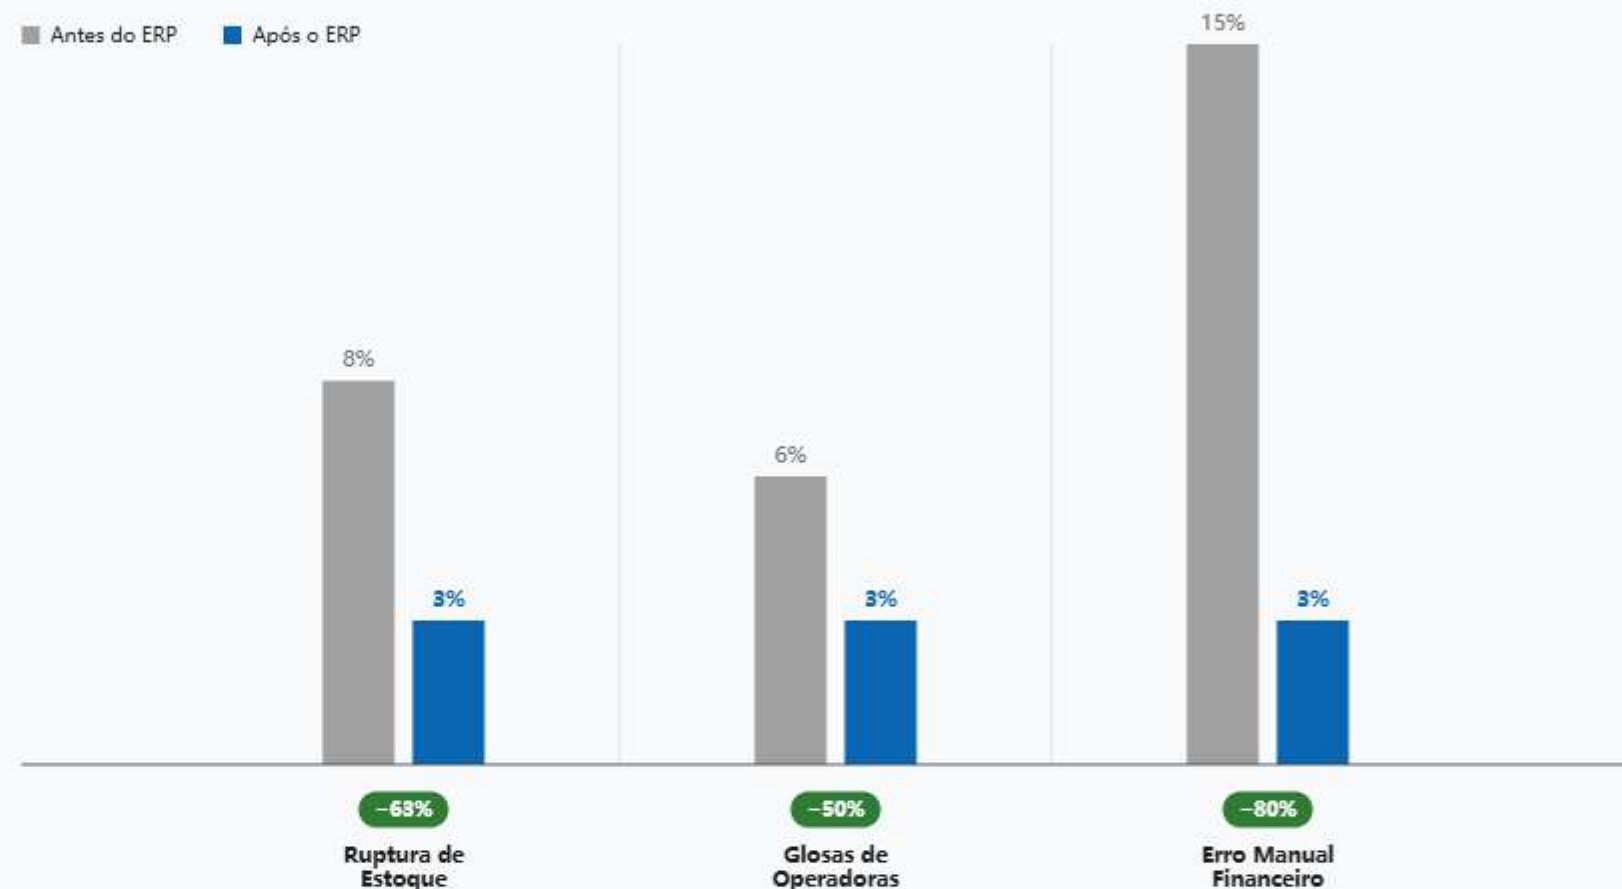

Benefícios Indiretos:

- Fim do retrabalho com planilhas paralelas entre setores.
- Painéis em tempo real empoderando a diretoria com dados exatos.
- Previsibilidade de suprimentos clínicos e aumento do NPS hospitalar.

Muito Obrigado

VidaPlus: transformando dados em decisão

